

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和08年02月18日

計画の名称	山陽小野田市における誰もが安心して快適に暮らせるまちづくりの実現（防災・安全）											
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	山陽小野田市											
計画の目標	下水道整備・改築を行い、安心・安全で快適な生活環境を実現するとともに、災害に強いまちづくりを推進する。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	2,109	A	2,109	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初		R6末
1	長寿命化計画（処理場、ポンプ場）に基づく改築更新達成率を84%（R2）から100%（R3）に増加させる。 処理場ポンプ場の長寿命化計画に基づく改築更新達成率 長寿命化対策済み施設数（箇所） / 長寿命化対策を実施すべき施設数（箇所）	84%	%	100%
2	ストックマネジメント計画（処理場）に基づく改築更新達成率を0%（R2）から16%（R6）に増加させる。 処理場ストックマネジメント計画に基づく改築更新達成率 改築実施済み施設数（箇所） / 改築すべき施設数（箇所）	0%	%	16%
3	ストックマネジメント計画（ポンプ場）に基づく改築更新達成率を0%（R2）から17%（R6）に増加させる。 ポンプ場ストックマネジメント計画に基づく改築更新達成率 改築実施済み施設数（箇所） / 改築すべき施設数（箇所）	0%	%	17%
4	下水道による高千帆地区浸水対策整備進捗率を0%（R2）から100%（R6）に増加させる。 浸水対策整備進捗率 浸水対策完了済面積（ha） / 浸水対策を実施すべき面積（ha）	0%	%	100%
5	ストックマネジメント計画（マンホール蓋、マンホールポンプ）に基づく改築更新達成率を0%（R2）から100%（R6）に増加させる。 管渠ストックマネジメント計画に基づく改築更新達成率 改築実施済み施設数（箇所） / 改築すべき施設数（箇所）	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
山口県国土強靱化地域計画に基づき実施される要素事業：A07-008～009												

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	山陽小野田市	直接	山陽小野田市	終末処理場	改築	小野田水処理センター(1 4,800m3/日)	調査・設計	山陽小野田市						88	策定済	
		2																	
	A07-002	下水道	一般	山陽小野田市	直接	山陽小野田市	終末処理場	改築	小野田水処理センター(1 4,800m3/日)	改築・更新工事	山陽小野田市						1,111	策定済	
		2																	
	A07-003	下水道	一般	山陽小野田市	直接	山陽小野田市	ポンプ場	改築	下水道ポンプ場整備事業 (小野田処理区)	改築・更新工事	山陽小野田市						150	策定済	
		1																	
	A07-004	下水道	一般	山陽小野田市	直接	山陽小野田市	ポンプ場	改築	下水道ポンプ場整備事業 (小野田処理区)	調査・設計	山陽小野田市						12	策定済	
		3																	
	A07-005	下水道	一般	山陽小野田市	直接	山陽小野田市	ポンプ場	改築	下水道ポンプ場整備事業 (小野田処理区)	改築・更新工事	山陽小野田市						215	策定済	
		3																	
	A07-006	下水道	一般	山陽小野田市	直接	山陽小野田市	ポンプ場	改築	雨水排水ポンプ場整備事業	調査・設計	山陽小野田市						0	策定済	
		3																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-007	下水道	一般	山陽小野田市	直接	山陽小野田市	ポンプ場	改築	雨水排水ポンプ場整備事業	改築・更新工事	山陽小野田市						0		策定済
		3																	
	A07-008	下水道	一般	山陽小野田市	直接	山陽小野田市	管渠(雨水)	新設	高千帆地区浸水対策事業	調査・設計	山陽小野田市						67		-
		4																	
	A07-009	下水道	一般	山陽小野田市	直接	山陽小野田市	管渠(雨水)	新設	高千帆地区浸水対策事業	雨水渠工事	山陽小野田市						0		-
		4																	
	A07-010	下水道	一般	山陽小野田市	直接	山陽小野田市	管渠(汚水)	改築	管渠改築事業(小野田処理区)	調査・設計	山陽小野田市						8		策定済
		5																	
	A07-011	下水道	一般	山陽小野田市	直接	山陽小野田市	管渠(汚水)	改築	管渠改築事業(小野田処理区)	改築工事	山陽小野田市						0		策定済
		5																	
	A07-012	下水道	一般	山陽小野田市	直接	山陽小野田市	終末処理場	改築	山陽水処理センター(3,100m3/日)	改築・更新工事	山陽小野田市						125		策定済
		1																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-013	下水道	一般	山陽小野田市	直接	山陽小野田市	終末処理場	改築	山陽水処理センター(3,100m3/日)	調査・設計	山陽小野田市						29		策定済
		2																	
	A07-014	下水道	一般	山陽小野田市	直接	山陽小野田市	終末処理場	改築	山陽水処理センター(3,100m3/日)	改築・更新工事	山陽小野田市						129		策定済
		2																	
	A07-015	下水道	一般	山陽小野田市	直接	山陽小野田市	ポンプ場	改築	下水道ポンプ場整備事業(山陽処理区)	改築・更新工事	山陽小野田市						66		策定済
		1																	
	A07-016	下水道	一般	山陽小野田市	直接	山陽小野田市	ポンプ場	改築	下水道ポンプ場整備事業(山陽処理区)	調査・設計	山陽小野田市						12		策定済
		3																	
	A07-017	下水道	一般	山陽小野田市	直接	山陽小野田市	ポンプ場	改築	下水道ポンプ場整備事業(山陽処理区)	改築・更新工事	山陽小野田市						89		策定済
		3																	
	A07-018	下水道	一般	山陽小野田市	直接	山陽小野田市	管渠(汚水)	改築	管渠改築事業(山陽処理区)	調査・設計	山陽小野田市						8		策定済
		5																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-019	下水道	一般	山陽小野田市	直接	山陽小野田市	管渠(汚水)	改築	管渠改築事業(山陽処理区)	改築工事	山陽小野田市						0		策定済
		5																	
											小計						2,109		
											合計						2,109		


事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
山陽小野田市社会資本整備事業評価委員会設置・運営要領に基づき、事後評価委員会を実施した。	令和7年度（2025年）
	公表の方法
	本市ホームページ
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・ストックマネジメント計画に基づき老朽化した下水道施設の計画的な改築更新により施設の健全度の向上を図ることができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
今後も、ストックマネジメント計画に基づき、下水道施設の計画的な改築を行うことにより、下水道機能の継続的な維持を図る。 また、近年増加傾向にある集中豪雨に対して雨水幹線等の整備を進めることにより、浸水地域の被害軽減を図り、誰もが安心して快適なまちづくりの実現を目指す。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	処理場ポンプ場の長寿命化計画に基づく改築更新達成率	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%
計画的な事業執行に努め、目標を達成した。		
2	処理場ストックマネジメント計画に基づく改築更新達成率	
	最終目標値	16%
	最終実績値	18%
当初計画した箇所に加え、補正による追加執行を活用し、目標値以上を達成することができた。		
3	ポンプ場ストックマネジメント計画に基づく改築更新達成率	
	最終目標値	17%
	最終実績値	21%
当初計画した箇所に加え、補正による追加執行を活用し、目標値以上を達成することができた。		
4	浸水対策整備進捗率	
	最終目標値	100%
	最終実績値	0%
処理場、ポンプ場の改築更新を最優先としたため。		
5	管渠ストックマネジメント計画に基づく改築更新達成率	
	最終目標値	100%
	最終実績値	25%
処理場、ポンプ場の改築更新を最優先としたため。		

(参考図面) 防災・安全交付金


計画の名称	山陽小野田市における誰もが安心して快適に暮らせるまちづくりの実現 (防災・安全)		
計画の期間	令和2年度 ~ 令和6年度 (5年間)	交付対象	山陽小野田市

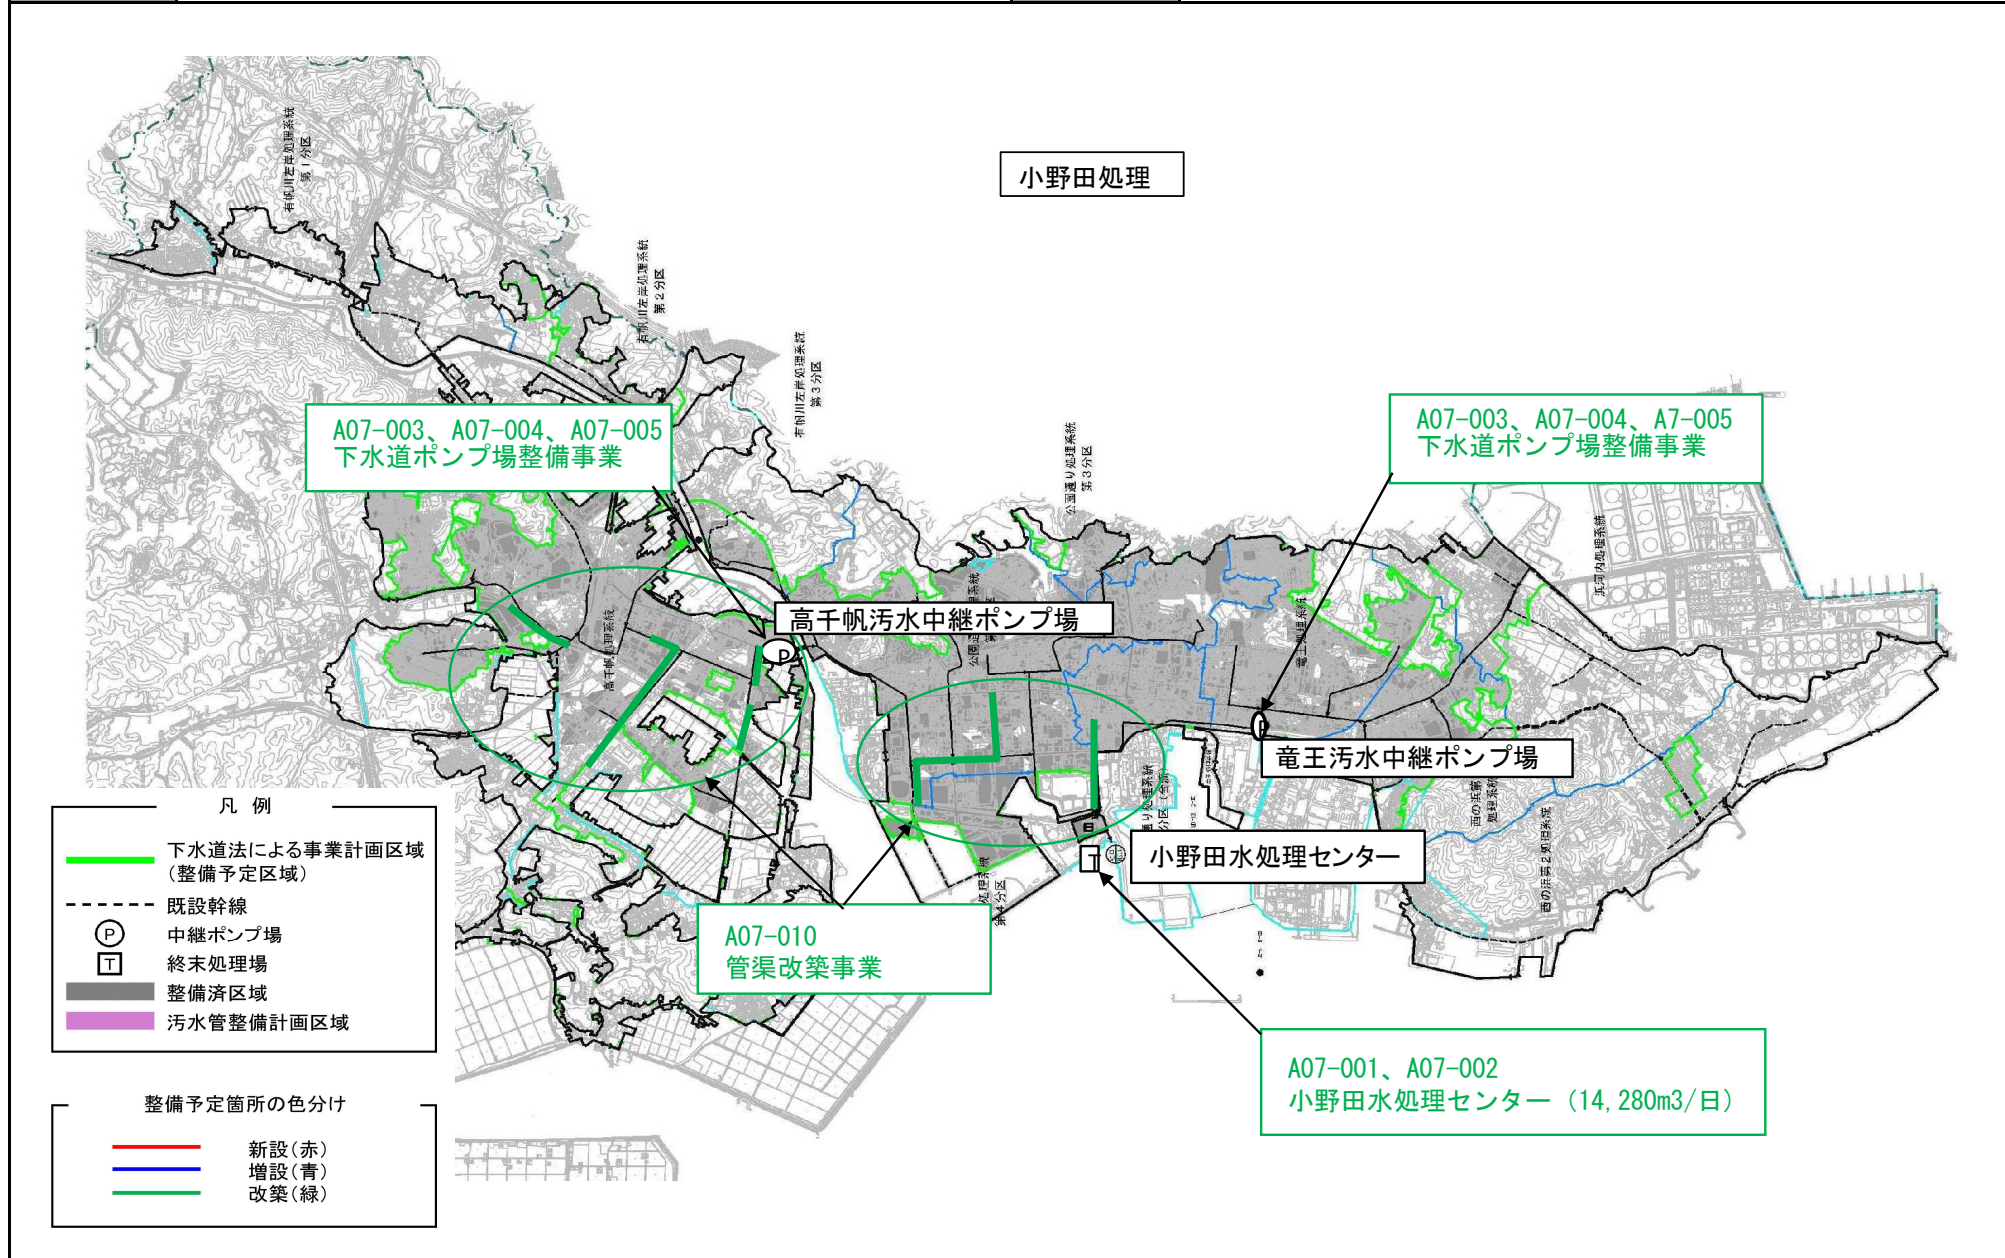



(参考図面) 防災・安全交付金

計画の名称	山陽小野田市における誰もが安心して快適に暮らせるまちづくりの実現 (防災・安全)		
計画の期間	令和2年度 ~ 令和6年度 (5年間)	交付対象	山陽小野田市

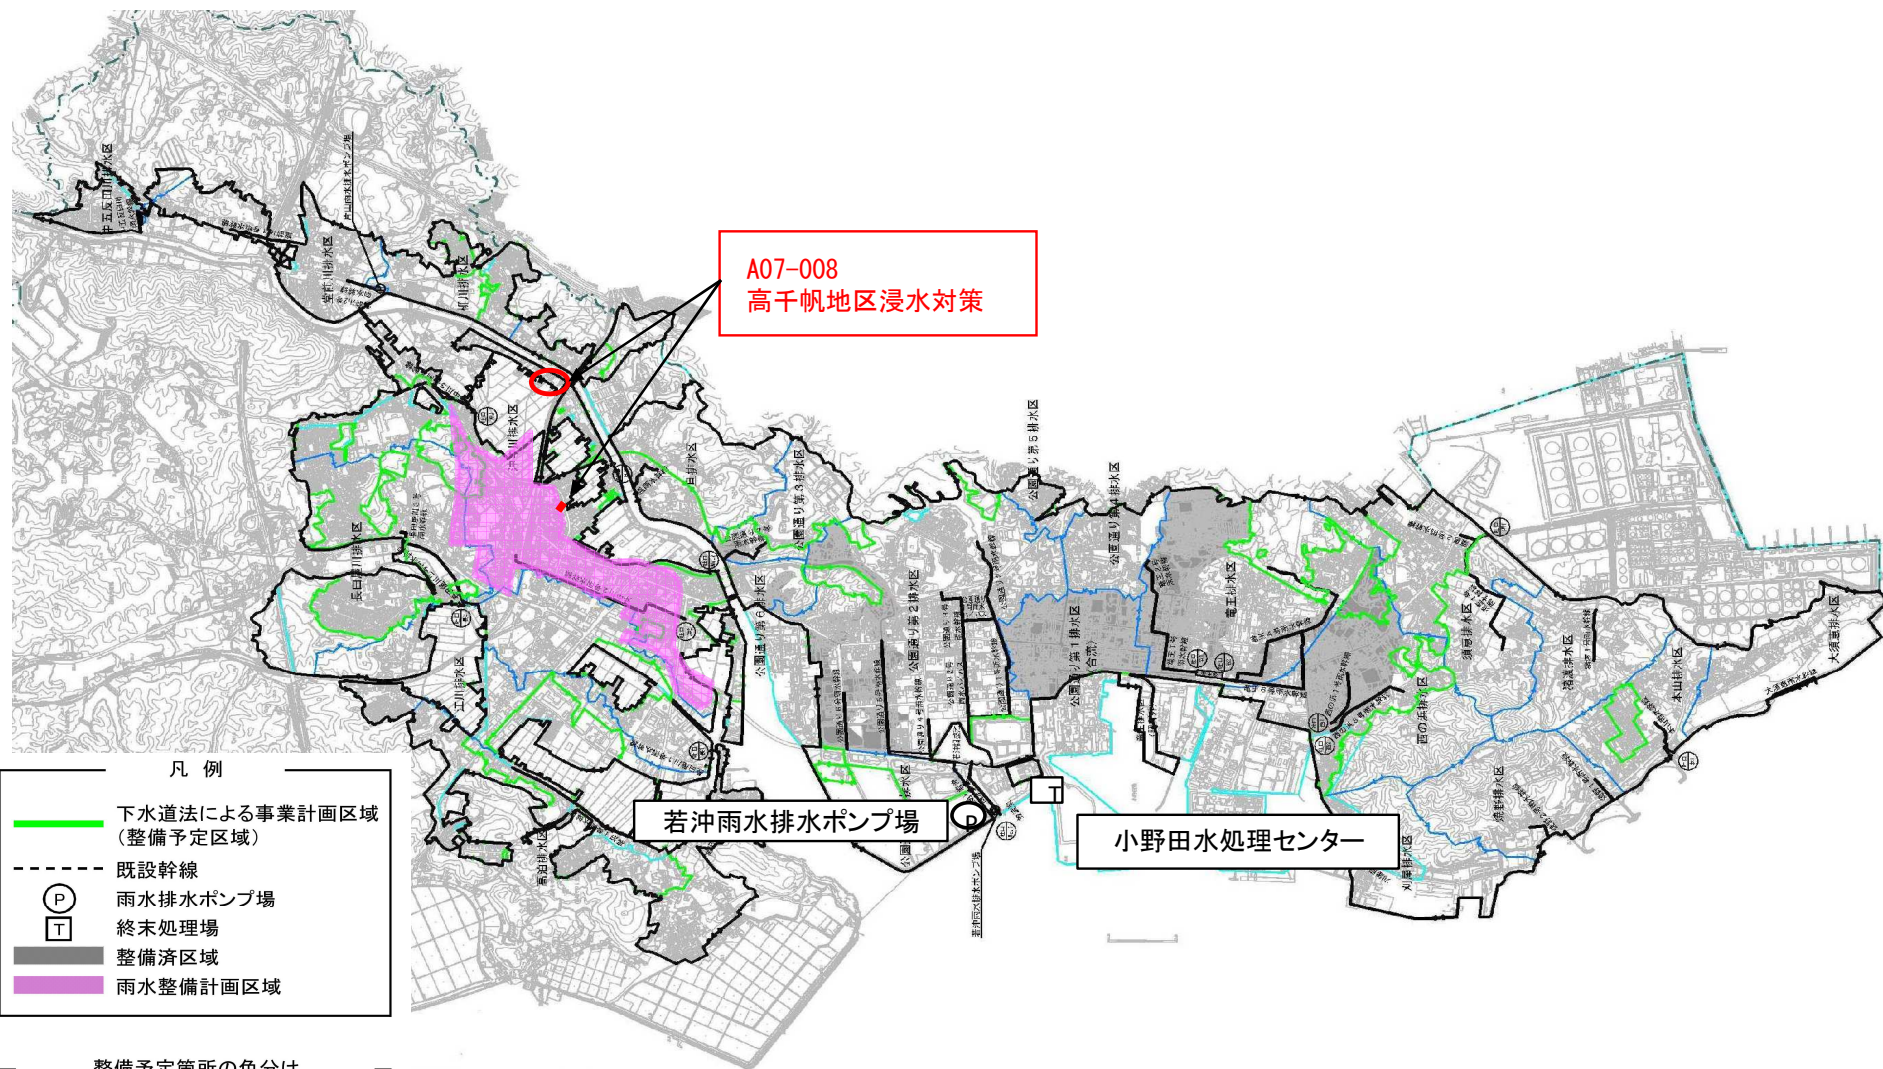

- 凡例
- 下水道法による事業計画区域 (整備予定区域)
  - - - 既設幹線
  - P 雨水排水ポンプ場
  - T 終末処理場
  - 整備済区域
  - 雨水整備計画区域

- 整備予定箇所の色分け
- 新設(赤)
  - 増設(青)
  - 改築(緑)
