

# 埴生地区複合施設整備事業 【社会教育課】

撮影場所	
埴生複合施設敷地	
4月末現場状況	
撮影場所	
埴生複合施設敷地	
4月末現場状況	
撮影場所	
埴生複合施設敷地	
4月末現場状況	

# 資料1

工事名称 埴生地区複合施設整備事業(建築主体工事)

工事場所 山陽小野田市大字埴生275番地ほか 地内

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築主体工事	1	式	239,218,534 239,218,534 0	
機械設備工事	1	式	64,058,614 64,058,614 0	
中止期間費用	1	式	0 19,636,804 19,636,804	
計			303,277,148 322,913,952 19,636,804	
共通費				
共通仮設費	1	式	19,942,388 19,942,388 0	
現場管理費	1	式	33,126,770 33,126,770 0	
一般管理費等	1	式	40,533,694 42,496,890 1,963,196	
計			93,602,852 95,566,048 1,963,196	
工事価格	1	式	396,880,000 418,480,000 21,600,000	

資料2

NO	名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	埴生地区複合施設整備事業(建築主体工事)に伴う変更追加工事						
	(工期延長分)						
1	現場内リース品		式	1.0		404,774	
2	仮囲いリース料		式	1.0		484,842	
3	敷き鉄板リース料		式	1.0		900,000	
4	工事事務所リース料	a) 工事事務所	式	1.0		2,509,482	
		b) 監督員事務所備品	式	1.0		399,149	
5	その他雑費		式	1.0		4,226,120	
6	作業所管理費		式	1.0		10,712,437	
	計					19,636,804	

NO	名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
1	現場内リース品他						
	12月分 (光東)	発電機、ハイプレッシャーポンプ、 ノッチタンク、水中ポンプ	式	1.0	50,050	50,050	添付資料 1 ①
	12月分 (森岡石油)	軽油 64.600 (発電機用)	式	1.0	8,229	8,229	②
	1月分 (光東)	ハイプレッシャーポンプ、ノッチタンク、 水中ポンプ、ゴートリール	式	1.0	110,000	110,000	③
	2月分 (光東)	ハイプレッシャーポンプ、ノッチタンク、 水中ポンプ、ゴートリール	式	1.0	72,000	72,000	④
	3月分 (光東)	水中ポンプ、ゴートリール	式	1.0	25,000	25,000	⑤
	4月分 (光東)	水中ポンプ、ゴートリール	式	1.0	26,000	26,000	⑥
	5月分 (光東)	水中ポンプ、ゴートリール	式	1.0	40,762	40,762	⑦
	小計					332,041	
	12月分 (アシスト)	単管ハリカート、単管パイプ	式	1.0	15,000	15,000	添付資料 2 ①
	1月分 (アシスト)	単管ハリカート、単管パイプ	式	1.0	5,800	5,800	②
	2月分 (アシスト)	単管ハリカート、単管パイプ	式	1.0	5,400	5,400	③
	3月分 (アシスト)	単管ハリカート、単管パイプ	式	1.0	43,000	43,000	④
	4月分 (アシスト)	単管ハリカート、単管パイプ	式	1.0	-11,020	-11,020	3月分価格訂正 ⑤
	5月分 (アシスト)	単管ハリカート、単管パイプ	式	1.0	14,553	14,553	⑥

NO	名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	小計					72,733.	
	計					404,774	

NO	名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
2	仮囲いリース料						
	仮囲い成形鋼板	H=3.0m*362枚	月	5.7	60,880	347,016	添付資料 3 ①
	小計					347,016	
	パネルゲート	W7.2*H4.5	月	5.7	24,180	137,826	添付資料 3 ②
	小計					137,826	
	計					484,842	

NO	名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
3	敷き鉄板リース料						
	敷き鉄板	5*20 t=22mm	月	5.7		900,000	添付資料 4
	計					900,000	



NO	名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
4	工事事務所リース料						
	a) 工事事務所						
	連棟ユニットハウス他	8連*2階	月	5.7	227,200	1,295,040	添付資料 5①
	事務所備品		月	5.7	213,060	1,214,442	添付資料 5②
	小計					2,509,482	
	b) 監督員事務所備品						
	事務所備品		月	4.0	76,170	304,680	添付資料 5③
	事務所備品		月	1.7	55,570	94,469	添付資料 5④
	小計					399,149	

NO	名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
5	その他雑費						
	a) 雑工						
	12月度雑工計	ｱｰｷﾃｸﾄ ｶﾉ、セｷﾖ724	式	1.0		196,000	添付資料 6 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
	1月度雑工計	ｱｰｷﾃｸﾄ ｶﾉ、セｷﾖ724	式	1.0		55,000	
	2月度雑工計	ｱｰｷﾃｸﾄ ｶﾉ	式	1.0		105,000	
	3月度雑工計	ｱｰｷﾃｸﾄ ｶﾉ	式	1.0		332,500	
	4月度雑工計	ｱｰｷﾃｸﾄ ｶﾉ	式	1.0		195,000	
	5月度雑工計	ｱｰｷﾃｸﾄ ｶﾉ、光正建設、セｷﾖ724	式	1.0		236,000	
	6・7月度雑工	養生撤去 (今後)	工	35.5	15,000	532,500	
	小計					1,652,000	
	b) 養生材購入						
	12月度養生材購入計		式	1.0		27,200	添付資料 7 ① ② ③ ④ ⑤
	1月度養生材購入計		式	1.0		8,800	
	2月度養生材購入計		式	1.0		18,000	
	3月度養生材購入計		式	1.0		80,500	
	4月度養生材購入計		式	1.0		145,480	

NO	名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	5月度養生材購入計	〃	式	1.0		22,000	添付資料 7 ⑥
	養生材処分費	5月以降	式	1.0		100,000	明細なし
	重機費	5月以降、養生材吊りこみ	式	1.0		128,000	明細なし
	小計					529,980	
	C) 捨てコンクリート硬化対策						
	振動ドリル釘穴削孔	基礎・地中梁 捨て桟木打付け費共	m	1,022.0	770	786,940	添付資料 8
	小計					786,940	
	d) 鉄骨錆止め塗装						
	C型鋼 現場錆止め1回塗り	JIS K 5674	m <sup>2</sup>	650.8	1,200	780,960	添付資料 9
	柱・梁 現場錆止め1回塗り	JIS K 5674	m <sup>2</sup>	500.0	800	400,000	
	法定福利費					76,000	
	値引					-1,960	
	小計					1,255,000	

NO	名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	e)その他雑費						
	収入印紙・でんさい手数料	12月分 (H31. 1. 31支払)	式	1.0	1,000	1,000	添付資料 10 ①
	収入印紙・でんさい手数料	1月分 (H31. 2. 28支払)	式	1.0	400	400	②
	収入印紙	2月分 (H31. 4. 1支払)	式	1.0	200	200	③
	収入印紙	3月分 (R1. 5. 7支払)	式	1.0	200	200	④
	収入印紙	4月分 (R1. 5. 31支払)	式	1.0	200	200	⑤
	収入印紙	5月分 (R1. 7. 1支払)	式	1.0	200	200	⑥
	小計					2,200	
	計					4,226,120	

NO	名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
6	作業所管理費						
①	作業所管理費		月	5.7	1,350,000	7,695,000	添付資料 11
	電気代		式	1.0		96,024	添付資料 12
	電話代		式	1.0		93,663	添付資料 13
	測量機リース		式	1.0		47,500	添付資料 14
	小計					7,932,187	
②	現場費						
	鉄筋材料保管費		t	65.5			添付資料 15
	材料保管費の内訳						
		H30 12/3~12/28	日	23.0	4,800	110,400	日曜日の休日は日数に含まない
		H31 1/7~1/31	日	22.0	4,800	105,600	"
		H31 2/1~2/28	日	24.0	4,800	115,200	"
		H31 3/1~3/31	日	26.0	4,800	124,800	"
		H31 4/1~4/30	日	26.0	4,800	124,800	"
		R1 5/1~5/22	日	14.0	4,800	67,200	日曜日・GWは除く

NO	名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	小計					648,000	
		天井クレーンによる保管場所の移動費及びそれに掛かる損料	回	5.0	30,000	150,000	
	計					798,000	
	鉄骨材料保管費		t	117.0			
	港ヤード賃貸料		m <sup>2</sup>	400.0	2,000	800,000	添付資料 16
	運搬費	10t車	台	15.0	38,000	570,000	
	重機費	25tラフター	日	5.0	65,000	325,000	
	荷下ろし	人工費	工	12.0	18,000	216,000	
	計					1,911,000	


NO	名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	養生ブルーシート処分費		式	1.0		71,250	添付資料 17
	合計					10,712,437	

埴生小・中学校、埴生複合施設整備事業スケジュール

事業名	業務内容	令和元年度												令和2年度											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
埴生小・中学校 整備事業	児童棟建設工事																								
	生徒棟改修工事(I期)																								
	生徒棟改修工事(II期)																								
	外構工事(I期)																								
	外構工事(II期)																								
埴生地区 複合施設 整備事業	複合施設建設工事																								
	外構工事																								



# 埴生小・中学校外構工事説明図

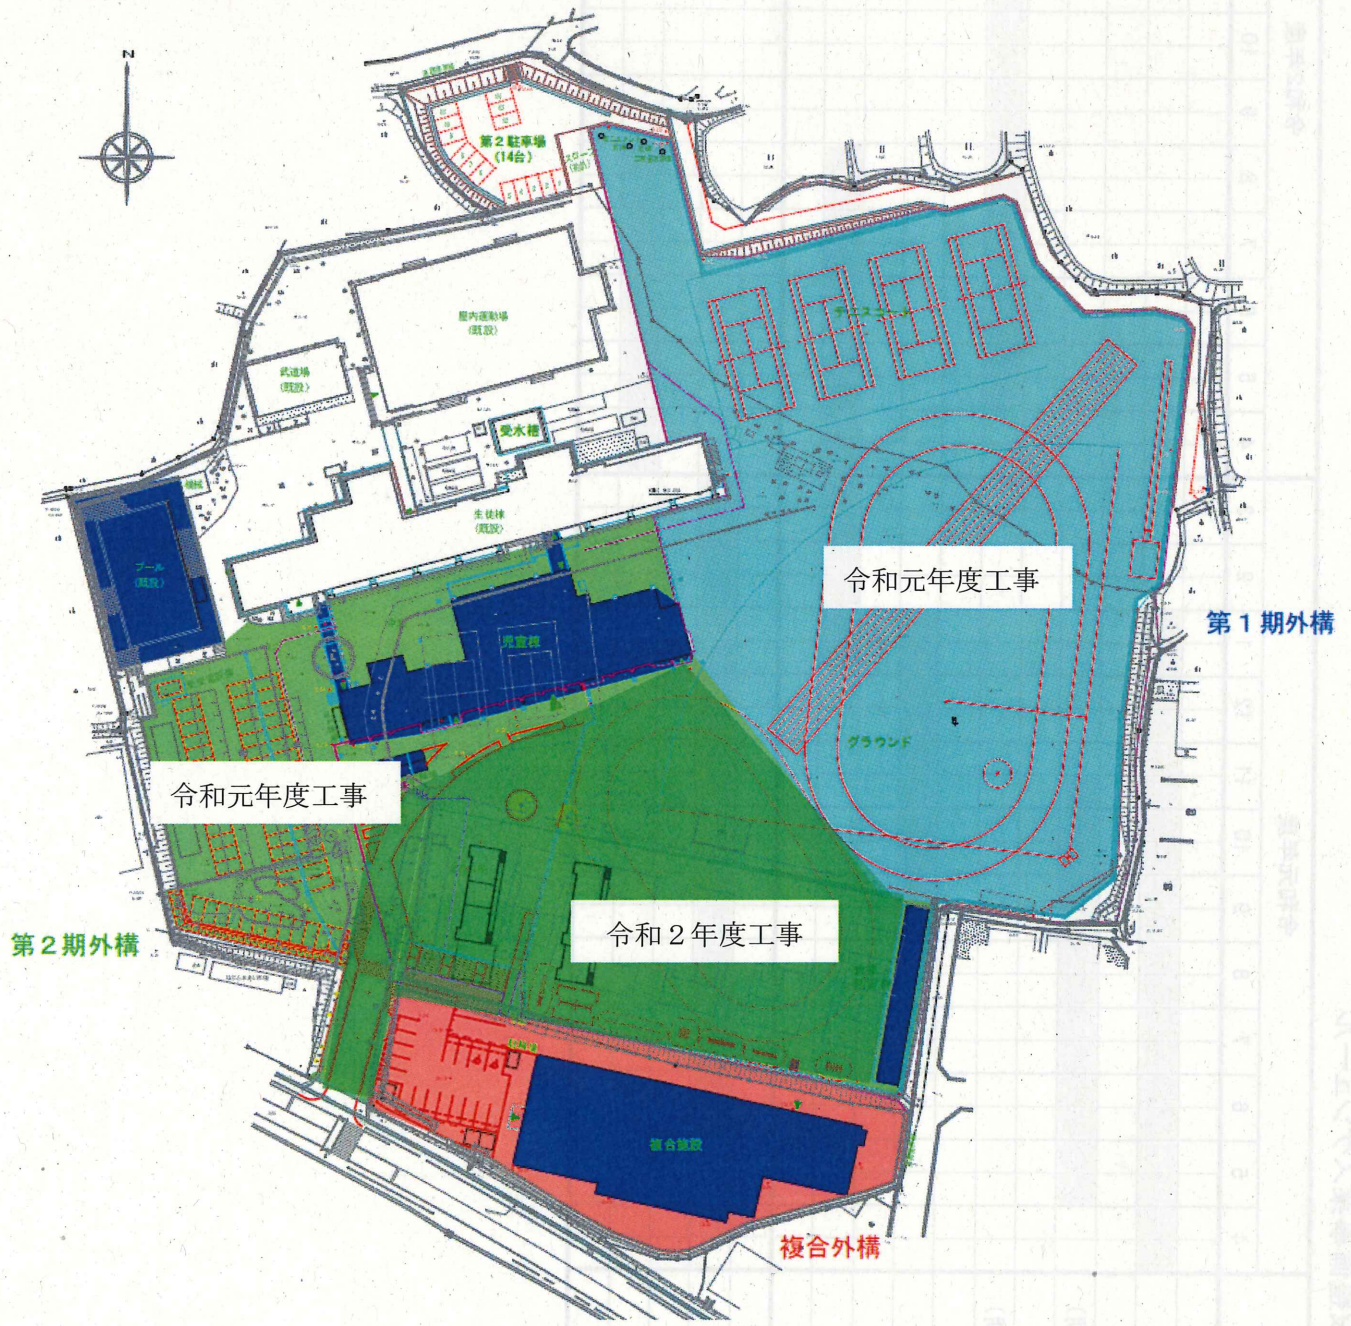

埴生小・中学校外構工事説明図
